PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAPORAN
MINGGUAN DAN BULANAN
KEMAJUAN PEKERJAAN FISIK

BULAN KE	:	I - II
TANGGAL	:	30 JUNI S/D 28 AGUSTUS 2025
MINGGU KE	:	1 S/D 7

KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025
PEKERJAAN	:	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
LOKASI	:	KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG KAL SEL



KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. BANGUN BANUA

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

- SURAT PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- PETA SITUASI

I. DATA PROYEK

II. DISKRIPSI PROYEK

III. URAIAN JENIS PEKERJAAN

IV. KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

V. PEMBAYARAN HARGA BORONGAN

VI. PERSONIL DAN PERALATAN

VII. PENUTUP

VIII. LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

IX. INTRUKSI / MEMO

X. REQUEST FOR WORK (PENGAJUAN RENCANA KERJA)


XI. LAPORAN TENAGA DAN HARIAN KERJA

XII. CATATAN HARIAN KERJA


XIII. FOTO FOTO KEGIATAN

XIV. LAIN – LAIN

Dipindai dengan CamScanner

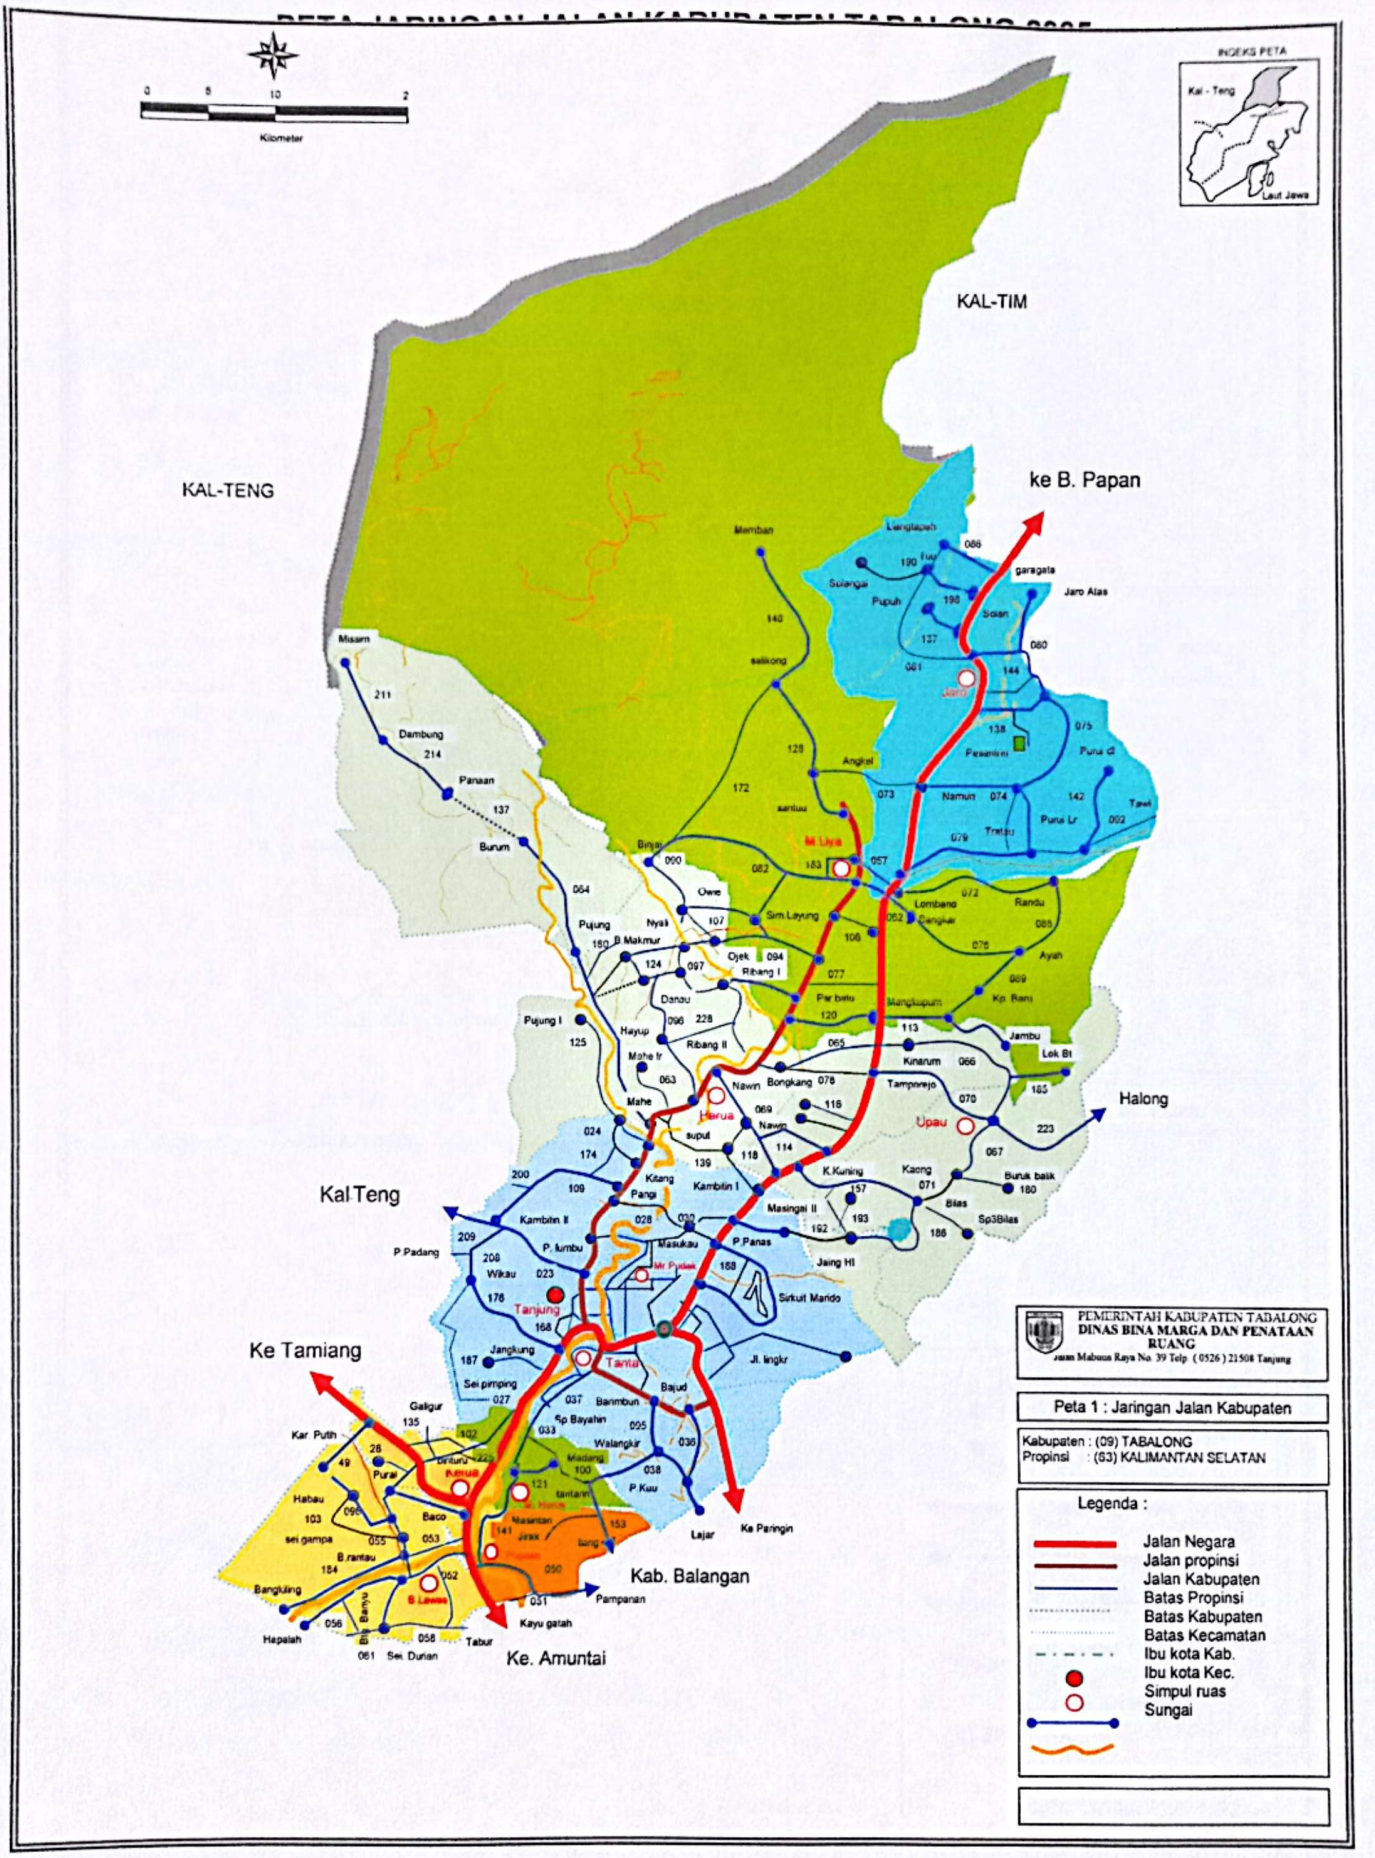

Dipindai dengan CamScanner

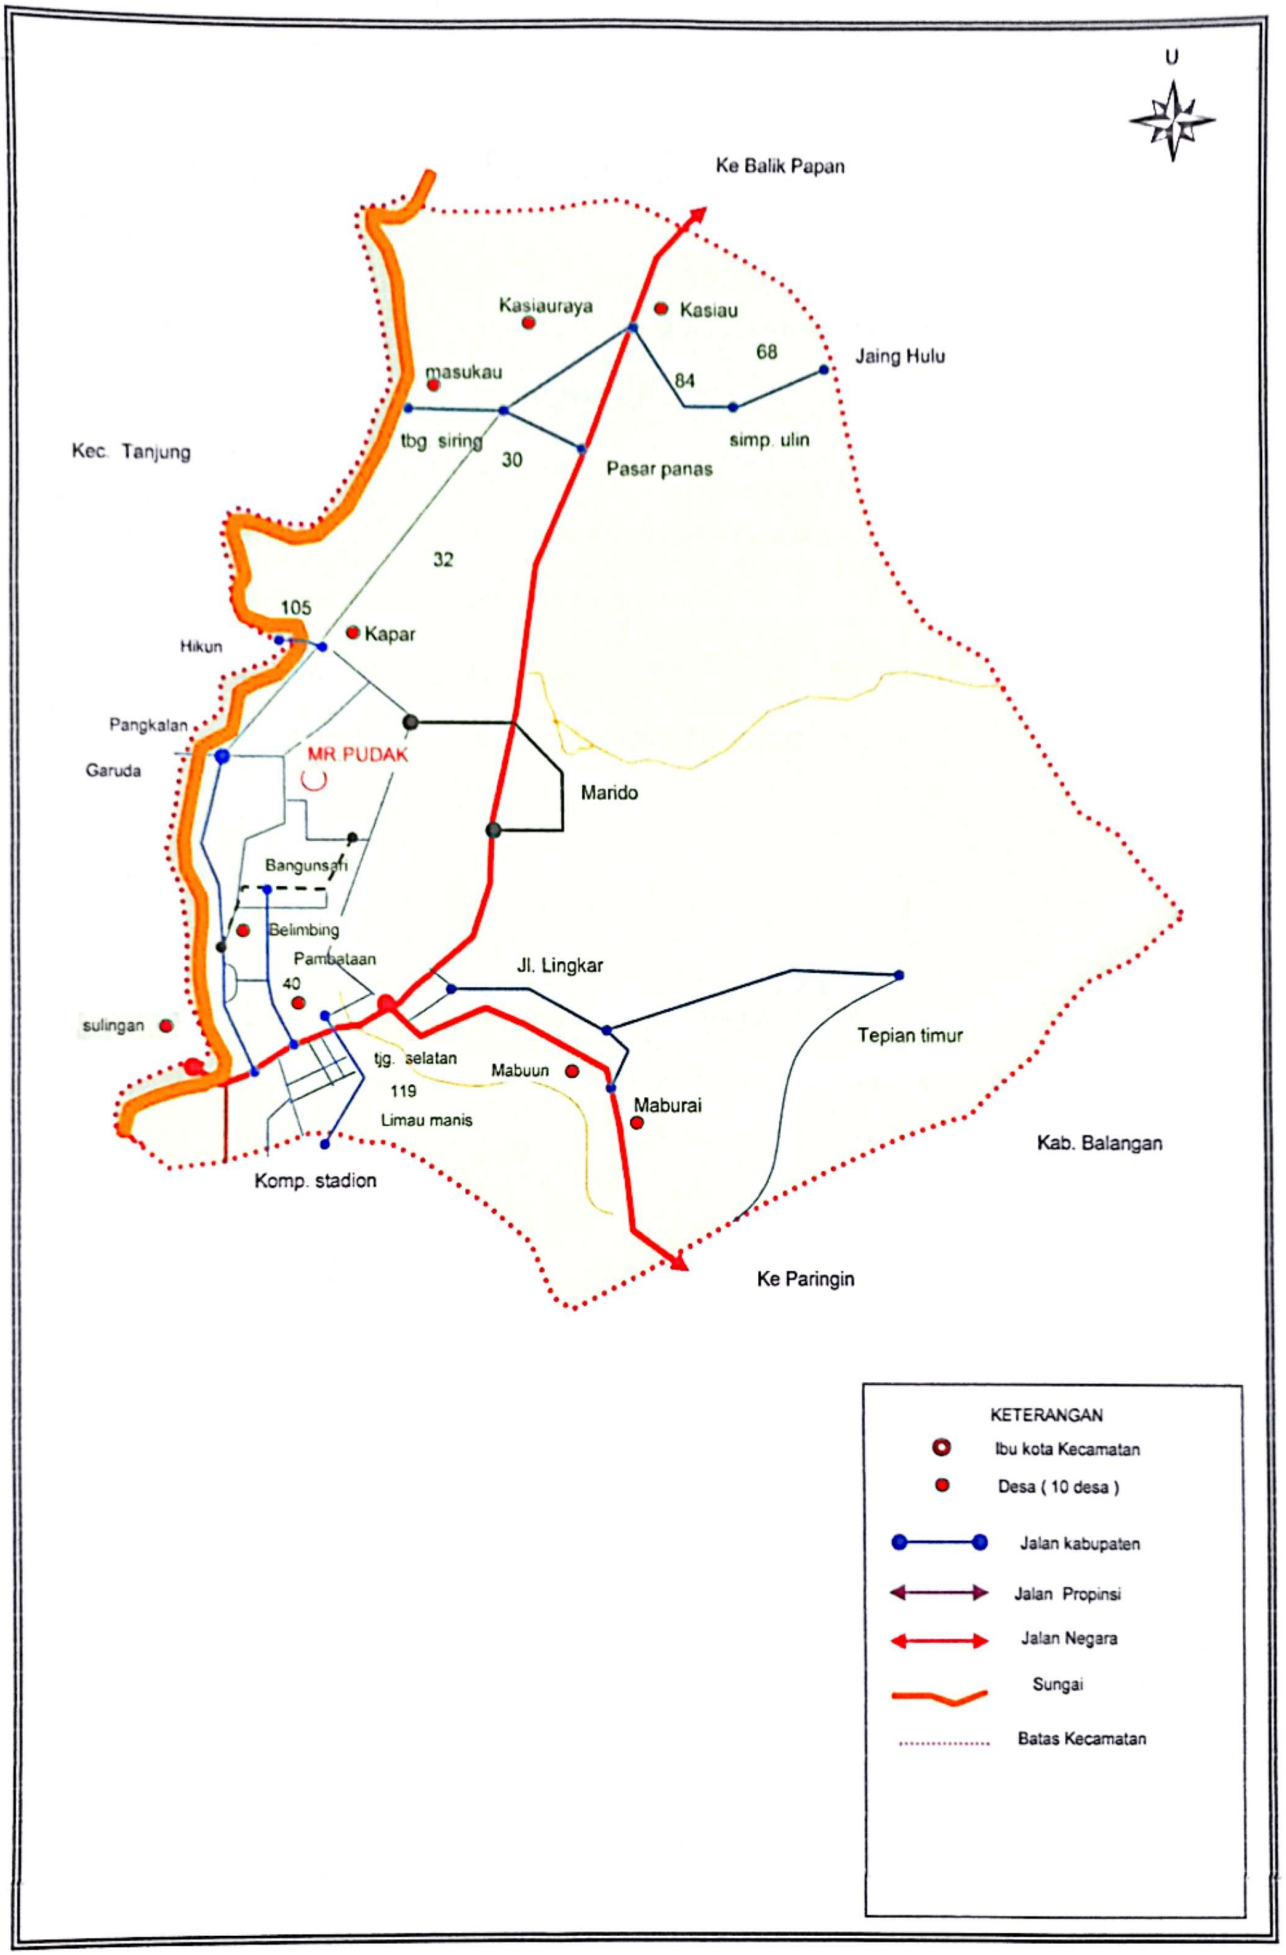

Dipindai dengan CamScanner

BAB. I DATA PROYEK

1.	KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025.
2.	PEKERJAAN	: PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
3.	LOKASI	: KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG
4.	KONTRAKTOR	: CV. BANGUN BANUA
5.	BIAYA KONTRAK	: Rp.2,758.205.000,00
6.	NOMOR KONTRAK	: B -1690/DPUPR/600.1.9/VI/2025
7.	TANGGAL KONTRAK	: 24 JUNI 2025
8.	NOMOR SPMK	:
9.	TANGGAL SPMK	:
10.	WAKTU PELAKSANAAN	: 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER
11.	MASA PEMELIHARAAN	: 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) HARI KALNDER
12.	SUMBER DANA	: APBD

Dipindai dengan CamScanner

BAB. II DISKRIPSI PROYEK

II .1. UMUM

Maksud dari pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten secara operasional, melaksanakan Pemeliharaan Jalan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi jalan darat di daerah kecamatan Murung Pudak khususnya Jalan Sp.4 Murung Pudak - Masukau.

II .2. BAHAN MATRIAL

Bahan / material yang digunakan untuk Pemeliharaan Jalan Sp.4 Murung Pudak - Masukau adalah :

- Lapis Pondasi Agregat Kelas A
- Lapis Perekat – Aspal Cair
- Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)
- Bahan Anti Pengelupasan

II .3. DATA – DATA dan GAMBAR KONTRUKSI.

Data – data dan gambar jalan yang dilaksanaan pada pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sp.4 Murung Pudak - Masukau Kecamatan Murung Pudak dapat dilihat pada halaman berikut.:

Dipindai dengan CamScanner

BAB. III URAIAN JENIS PEKERJAAN

III .1. JENIS – JENIS PEKERJAAN

Macam – macam dan jenis pekerjaan yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV. BANGUN BANUA pada pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sp.4 Murung Pudak - Masukau Kecamatan Murung Pudak meliputi :

1. Pekerjaan pendahuluan antara lain :
   - Mobilisasi.
   - Manajemen Keselamatan Lalu Lintas
   - Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2. Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen antara lain :
   - Lapis Pondasi Agregat Kelas A

3. Pekerjaan Perkerasan Aspal antara lain :
   - Lapis Perekat – Aspal Cair
   - Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)
   - Bahan Anti Pengelupasan

III .2. BOBOT TIAP JENIS PEKERJAAN

Bobot dan volume tiap jenis pekerjaan atau tiap – tiap bagian pekerjaan dan prosentase tiap jenis pekerjaan terhadap seluruh pekerjaan maupun prosentase tiap bagian pekerjaan terhadap jenis jenis pekerjaan serta biaya tiap jenis pekerjaan atau bagian pekerjaan dapat dilihat pada tabel Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pekerjaan

Dipindai dengan CamScanner

BAB. IV KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

IV .1. PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jenis – jenis atau bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. BANGUN BANUA Pada bulan ini meliputi :

- Mobilisasi : dikerjakan
- Manajemen Keselamatan Lalu Lintas : dikerjakan
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja : dikerjakan
- Lapis Pondasi Agregat Kelas A : dikerjakan
- Lapis Perekat – Aspal Cair : dikerjakan
- Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) : dikerjakan
- Bahan Anti Pengelupasan : dikerjakan

IV .2. KEMAJUAN PEKERJAAN

Sampai akhir bulan ini kemajuan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana CV. BANGUN BANUA pada pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sp.4 Murung Pudak - Masukau Kecamatan Murung Pudak Untuk Bobot sudah mencapai 100 % sedang menurut time schedule sebesar 100 % ini berarti pekerjaan ada deviasi 00 %.

Dipindai dengan CamScanner

BAB. V PEMBAYARAN HARGA BORONGAN

Menurut surat perjanjian No : B -1690/DPUPR/600.1.9/VI/2025, Tgl 24 Juni 2025. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 pada Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sp.4 Murung Pudak - Masukau Kecamatan Murung Pudak dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi jalan darat di daerah kecamatan Murung Pudak yang dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. BANGUN BANUA :

1. Pembayaran uang muka adalah 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak.
2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara bulanan (*Monthly Certificate*).
3. Bila terdapat ketidak sesuaian dalam perhitungan angsuran, besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi – tingginya sebesar 70% (Tujuh puluh persen) dari jumlah nilai tagihan.

Pada akhir Bulan ini fisik pekerjaan yang telah dicapai adalah sebesar 100 %

Dipindai dengan CamScanner

BAB. VI PERSONIL DAN PERALATAN

VI. 1. PERSONIL KONTRAKTOR

Personil kontraktor pelaksana CV. BANGUN BANUA yang terlibat dalam pada pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sp.4 Murung Pudak - Masukau Kecamatan Murung Pudak Dapat dilihat pada tabel daftar personil CV. BANGUN BANUA sebagai mana terlampir dihalaman berikut.

VI. 2. PERALATAN KONTRAKTOR

Peralatan kontraktor CV. BANGUN BANUA yang digunakan pada bulan ini berupa :

- Aspal Finisher
- Aspal Distibutor
- Tandem Roller
- Tire Roller
- Alat Bantu

Sedangkan peralatan peralatan kontraktor pelaksana CV. BANGUN BANUA yang terlibat mengenai pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Sp.4 Murung Pudak - Masukau Kecamatan Murung Pudak
ini dapat dilihat pada daftar peralatan kontraktor sebagaimana terlampir

Dipindai dengan CamScanner

BAB. VII PENUTUP

KESIMPULAN

Pelaksanaan pekerjaan yang di kerjakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. BANGUN BANUA yaitu pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sp.4 Murung Pudak - Masukau Kecamatan Murung Pudak. Pada akhir Bulan ini yaitu periode dari tanggal 30 Juni 2025 s/d 28 Agustus 2025 ini cukup lancar, dimana prosentase fisik pekerjaan Bulan ini mencapai 100 % dan menurut Time Schedule sebesar 100 % ini berarti pekerjaan ada deviasi 00 %.

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN
KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

MINGGU KE : 1
TANGGAL : 30 Juni - 06 Juli 2025

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP 4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
DEPARTEMEN / INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG
KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
NOMOR KONTRAK : B -1890/DPUPR/600 1 9/VI/2025, Tanggal 24 JUNI 2025
NILAI KONTRAK : Rp. 2.758.205.000,00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	DATA KONTRAK			KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN					
					Kuantitas			Bobot (%)		
		Satuan	Kuantitas	Bobot (%)	Minggu lalu	Minggu ini	Total	Terhadap Mgg lalu	Terhadap Mgg ini	Terhadap Total Pek.
	1. UMUM									
1,2	Mobilisasi, Item mobilisasi terdiri dari :									
	a. Mobilisasi Asphalt Finisher	Unit	1,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Mobilisasi Tandem Roller	Unit	1,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Mobilisasi Tire Roller	Unit	1,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Mobilisasi Asphalt Distributor	Unit	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. Demobilisasi	Ls	1,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas									
	a. Rambu Peringatan Pekerjaan Dengaan Kata - kata	Buah	2,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Rambu Peringatan Pekerjaan Di Jalan	Buah	2,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Pekerja (Flagman)	OB	2,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri dari :									
	a. Topi pelindung (Safety helmet)	Buah	8,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Sepatu keselamatan (Safety shoes)	Pasang	8,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah	8,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu,Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban dll)	OB	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. Petugas K3	Ls	2,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,16				0,00	0,00	0,00
	5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	52,50	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,11				0,00	0,00	0,00
	6. PERKERASAN ASPAL									
6.1 (2a)	Lapisan Perekat - Aspal Cair	Liter	3.564,40	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.4a	Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	Ton	1.120,24	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.8	Bahan anti Pengelupasan	Ton	201,64	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,73				0,00	0,00	0,00
				100,00						0,00

Diperiksa oleh :
Dinas PUPR Bidang Bina Marga
PENGAWAS LAPANGAN

KASIH SEPTIANA, ST

Diperiksa oleh :
Konsultan Pengawas
CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

JANAL HAKIM
Pengawas Lapangan

RAGIL
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BANGUN BANUA

NENG INDAH
Pelaksana Lapangan

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN
KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

MINGGU KE : 2
TANGGAL : 07 Juli - 14 Juli 2025

KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025
SUB KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN	:	PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
DEPARTEMEN / INSTANSI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG
KONTRAKTOR	:	CV. BANGUN BANUA
NOMOR KONTRAK	:	B -1690/DPUPR/600.1.9/VI/2025, Tanggal 24 JUNI 2025
NILAI KONTRAK	:	Rp. 2.758.205.000,00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	DATA KONTRAK			KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN					
					Kuantitas			Bobot (%)		
		Satuan	Kuantitas	Bobot (%)	Minggu lalu	Minggu ini	Total	Terhadap Mgg lalu	Terhadap Mgg ini	Terhadap Total Pek
	1. UMUM									
1,2	Mobilisasi, Item mobilisasi terdiri dari									
	a. Mobilisasi Asphalt Finisher	Unit	1,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Mobilisasi Tandem Roller	Unit	1,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Mobilisasi Tire Roller	Unit	1,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Mobilisasi Asphalt Distributor	Unit	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. Demobilisasi	Ls	1,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas									
	a. Rambu Peringatan Pekerjaan Dengaan Kata - kata	Buah	2,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Rambu Peringatan Pekerjaan Di Jalan	Buah	2,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Pekerja (Flagman)	OB	2,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri dari									
	a. Topi pelindung (Safety helmet)	Buah	8,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Sepatu keselamatan (Safety shoes)	Pasang	8,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah	8,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu,Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban dll)	OB	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. Petugas K3	Ls	2,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,16				0,00	0,00	0,00
	5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
5 1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	52,50	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,11				0,00	0,00	0,00
	6. PERKERASAN ASPAL									
6.1 (2a)	Lapisan Perekat - Aspal Cair	Liter	3.564,40	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.4a	Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	Ton	1.120,24	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.6	Bahan anti Pengelupasan	Ton	201,64	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,73				0,00	0,00	0,00
				100,00						0,00

Diperiksa oleh :
Dinas PUPR Bidang Bina Marga
PENGAWAS LAPANGAN

KASIH SEPTIANA, ST

Diperiksa oleh :
Konsultan Pengawas
CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

RAGIL
Pengawas Lapangan

M. MAHLISANI
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BANGUN BANUA

NENG INDAH
Pelaksana Lapangan

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN
KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

MINGGU KE : 3
TANGGAL : 15 Juli - 21 Juli 2025

KEGIATAN	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025
SUB KEGIATAN	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN	PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
DEPARTEMEN / INSTANSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG
KONTRAKTOR	CV. BANGUN BANUA
NOMOR KONTRAK	B -1690/DPUPR/600 1 9/VI/2025, Tanggal 24 JUNI 2025
NILAI KONTRAK	Rp. 2 758 205 000 00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	DATA KONTRAK			KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN					
					Kuantitas			Bobot (%)		
		Satuan	Kuantitas	Bobot (%)	Minggu lalu	Minggu ini	Total	Terhadap Mgg lalu	Terhadap Mgg ini	Terhadap Total Pek.
	1. UMUM									
1,2	Mobilisasi, Item mobilisasi terdiri dari									
	a. Mobilisasi Asphalt Finisher	Unit	1,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Mobilisasi Tandem Roller	Unit	1,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Mobilisasi Tire Roller	Unit	1,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Mobilisasi Asphalt Distributor	Unit	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. Demobilisasi	Ls	1,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas									
	a. Rambu Peringatan Pekerjaan Dengaan Kata - kata	Buah	2,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Rambu Peringatan Pekerjaan Di Jalan	Buah	2,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Pekerja (Flagman)	OB	2,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri dari									
	a. Topi pelindung (Safety helmet)	Buah	8,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Sepatu keselamatan (Safety shoes)	Pasang	8,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah	8,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu,Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban dll)	OB	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. Petugas K3	Ls	2,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,16				0,00	0,00	0,00
	5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	52,50	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,11				0,00	0,00	0,00
	6. PERKERASAN ASPAL									
6.1 (2a)	Lapisan Perekat - Aspal Cair	Liter	3.564,40	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.4a	Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	Ton	1.120,24	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.8	Bahan anti Pengelupasan	Ton	201,64	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,73				0,00	0,00	0,00
				100,00						0,00

Diperiksa oleh :
Dinas PUPR Bidang Bina Marga
PENGAWAS LAPANGAN

KASIH SEPTIANA, ST

Diperiksa oleh :
Konsultan Pengawas
CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

RAGIL
Pengawas Lapangan

M. MAHLISANI
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BANGUN BANUA

NENG INDAH
Pelaksana Lapangan

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN
KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

MINGGU KE : 4
TANGGAL : 22 Juli - 29 Juli 2025

KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025
SUB KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN	:	PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
DEPARTEMEN / INSTANSI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG
KONTRAKTOR	:	CV. BANGUN BANUA
NOMOR KONTRAK	:	B-1690/DPUPR/600.1.9/VI/2025, Tanggal 24 JUNI 2025
NILAI KONTRAK	:	Rp. 2.758.205.000,00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	DATA KONTRAK			KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN					
					Kuantitas			Bobot (%)		
		Satuan	Kuantitas	Bobot (%)	Minggu lalu	Minggu ini	Total	Terhadap Mgg lalu	Terhadap Mgg ini	Terhadap Total Pek
	1. UMUM									
1,2	Mobilisasi, Item mobilisasi terdiri dari									
	a. Mobilisasi Asphalt Finisher	Unit	1,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Mobilisasi Tandem Roller	Unit	1,00	0,09	0,00	1,00	1,00	0,00	0,09	0,09
	c. Mobilisasi Tire Roller	Unit	1,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Mobilisasi Asphalt Distributor	Unit	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. Demobilisasi	Ls	1,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas									
	a. Rambu Peringatan Pekerjaan Dengaan Kata - kata	Buah	2,00	0,01	0,00	2,00	2,00	0,00	0,01	0,01
	b. Rambu Peringatan Pekerjaan Di Jalan	Buah	2,00	0,01	0,00	2,00	2,00	0,00	0,01	0,01
	c. Pekerja (Flagman)	OB	2,00	0,29	0,00	1,00	1,00	0,00	0,14	0,14
1,19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri dari									
	a. Topi pelindung (Safety helmet)	Buah	8,00	0,02	0,00	8,00	8,00	0,00	0,02	0,02
	b. Sepatu keselamatan (Safety shoes)	Pasang	8,00	0,04	0,00	8,00	8,00	0,00	0,04	0,04
	c. Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah	8,00	0,02	0,00	8,00	8,00	0,00	0,02	0,02
	d. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu,Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban dll)	OB	1,00	0,01	0,00	1,00	1,00	0,00	0,01	0,01
	e. Petugas K3	Ls	2,00	0,29	0,00	1,00	1,00	0,00	0,14	0,14
				1,16				0,00	0,49	0,49
	5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	52,50	1,11	0,00	52,50	52,50	0,00	1,11	**1,11**
				1,11				0,00	1,11	**1,11**
	6. PERKERASAN ASPAL									
6.1 (2a)	Lapisan Perekat - Aspal Cair	Liter	3.564,40	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.4a	Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	Ton	1.120,24	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.8	Bahan anti Pengelupasan	Ton	201,64	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,73				0,00	0,00	0,00
				100,00						1,60

Diperiksa oleh :
Dinas PUPR Bidang Bina Marga
PENGAWAS LAPANGAN

KASIH SEPTIANA, ST

JAINAL [illegible]

Diperiksa oleh :
Konsultan Pengawas
CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

RAGIL
Pengawas Lapangan

M. MAHLISANI
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BANGUN BANUA

NENG INDAH
Pelaksana Lapangan

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN
KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

MINGGU KE : 5
TANGGAL : 30 Juli - 05 Agustus 2025

KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025
SUB KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN	:	PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
DEPARTEMEN / INSTANSI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG
KONTRAKTOR	:	CV. BANGUN BANUA
NOMOR KONTRAK	:	B -1690/DPUPR/600.1.9/VI/2025, Tanggal 24 JUNI 2025
NILAI KONTRAK	:	Rp. 2.758.205.000,00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	DATA KONTRAK			KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN					
					Kuantitas			Bobot (%)		
		Satuan	Kuantitas	Bobot (%)	Minggu lalu	Minggu ini	Total	Terhadap Mgg lalu	Terhadap Mgg ini	Terhadap Total Pek.
	1. UMUM									
1,2	Mobilisasi, Item mobilisasi terdiri dari									
	a. Mobilisasi Asphalt Finisher	Unit	1,00	0,13	0,00	1,00	1,00	0,00	0,13	0,13
	b. Mobilisasi Tandem Roller	Unit	1,00	0,09	1,00	0,00	1,00	0,09	0,00	0,09
	c. Mobilisasi Tire Roller	Unit	1,00	0,13	0,00	1,00	1,00	0,00	0,13	0,13
	d. Mobilisasi Asphalt Distributor	Unit	1,00	0,01	0,00	1,00	1,00	0,00	0,01	0,01
	e. Demobilisasi	Ls	1,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas									
	a. Rambu Peringatan Pekerjaan Dengaan Kata - kata	Buah	2,00	0,01	2,00	0,00	2,00	0,01	0,00	0,01
	b. Rambu Peringatan Pekerjaan Di Jalan	Buah	2,00	0,01	2,00	0,00	2,00	0,01	0,00	0,01
	c. Pekerja (Flagman)	OB	2,00	0,29	1,00	1,00	2,00	0,14	0,14	0,29
1,19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri dari									
	a. Topi pelindung (Safety helmet)	Buah	8,00	0,02	8,00	0,00	8,00	0,02	0,00	0,02
	b. Sepatu keselamatan (Safety shoes)	Pasang	8,00	0,04	8,00	0,00	8,00	0,04	0,00	0,04
	c. Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah	8,00	0,02	8,00	0,00	8,00	0,02	0,00	0,02
	d. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu,Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban dll)	OB	1,00	0,01	1,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01
	e. Petugas K3	Ls	2,00	0,29	1,00	1,00	2,00	0,14	0,14	0,29
				1,16				0,49	0,56	1,05
	5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
5 1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	52,50	1,11	52,50	0,00	52,50	1,11	0,00	1,11
				1,11				1,11	0,00	1,11
	6. PERKERASAN ASPAL									
6.1 (2a)	Lapisan Perekat - Aspal Cair	Liter	3.564,40	3,08	0,00	1246,18	1246,18	0,00	1,08	1,08
6.3.4a	Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	Ton	1.120,24	93,68	0,00	387,20	387,20	0,00	32,38	32,38
6.3.8	Bahan anti Pengelupasan	Ton	201,64	0,96	0,00	69,70	69,70	0,00	0,33	0,33
				97,73				0,00	33,79	33,79
				100,00						35,95

Diperiksa oleh :	Diperiksa oleh :	Dibuat oleh :
Dinas PUPR Bidang Bina Marga	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PENGAWAS LAPANGAN	CV. AZ ZAHRA ALTASMIM	CV. BANGUN BANUA
KASIH SEPTIANA, ST	JAINAL HAKIM	RAGIL — Pengawas Lapangan
		M. MAHLISANI — Pengawas Lapangan
		NENG INDAH — Pelaksana Lapangan

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN
KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

MINGGU KE : 6
TANGGAL : 06 Agustus - 13 Agustus 2025

KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025
SUB KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN	:	PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
DEPARTEMEN / INSTANSI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG
KONTRAKTOR	:	CV. BANGUN BANUA
NOMOR KONTRAK	:	B-1690/DPUPR/600.1.9/VI/2025, Tanggal 24 JUNI 2025
NILAI KONTRAK	:	Rp. 2.758.205.000,00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	DATA KONTRAK			KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN					
					Kuantitas			Bobot (%)		
		Satuan	Kuantitas	Bobot (%)	Minggu lalu	Minggu ini	Total	Terhadap Mgg lalu	Terhadap Mgg ini	Terhadap Total Pek.
	1. UMUM									
1,2	Mobilisasi, Item mobilisasi terdiri dari									
	a. Mobilisasi Asphalt Finisher	Unit	1,00	0,13	1,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,13
	b. Mobilisasi Tandem Roller	Unit	1,00	0,09	1,00	0,00	1,00	0,09	0,00	0,09
	c. Mobilisasi Tire Roller	Unit	1,00	0,13	1,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,13
	d. Mobilisasi Asphalt Distributor	Unit	1,00	0,01	1,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01
	e. Demobilisasi	Ls	1,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas									
	a. Rambu Peringatan Pekerjaan Dengaan Kata - kata	Buah	2,00	0,01	2,00	0,00	2,00	0,01	0,00	0,01
	b. Rambu Peringatan Pekerjaan Di Jalan	Buah	2,00	0,01	2,00	0,00	2,00	0,01	0,00	0,01
	c. Pekerja (Flagman)	OB	2,00	0,29	2,00	0,00	2,00	0,29	0,00	0,29
1,19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri dari									
	a. Topi pelindung (Safety helmet)	Buah	8,00	0,02	8,00	0,00	8,00	0,02	0,00	0,02
	b. Sepatu keselamatan (Safety shoes)	Pasang	8,00	0,04	8,00	0,00	8,00	0,04	0,00	0,04
	c. Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah	8,00	0,02	8,00	0,00	8,00	0,02	0,00	0,02
	d. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu,Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban dll)	OB	1,00	0,01	1,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01
	e. Petugas K3	Ls	2,00	0,29	2,00	0,00	2,00	0,29	0,00	0,29
				1,16				1,05	0,00	1,05
	5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	52,50	1,11	52,50	0,00	52,50	1,11	0,00	1,11
				1,11				1,11	0,00	1,11
	6. PERKERASAN ASPAL									
6.1 (2a)	Lapisan Perekat - Aspal Cair	Liter	3.564,40	3,08	1246,18	1400,00	2646,18	1,08	1,21	2,29
6.3.4a	Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	Ton	1.120,24	93,68	387,20	440,00	827,20	32,38	36,80	69,18
6.3.8	Bahan anti Pengelupasan	Ton	201,64	0,96	69,70	79,20	148,90	0,33	0,38	0,71
				97,73				33,79	38,38	72,17
				100,00						74,34

Diperiksa oleh :	Diperiksa oleh :	Dibuat oleh :
Dinas PUPR Bidang Bina Marga	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PENGAWAS LAPANGAN	CV. AZ ZAHRA ALTASMIM	CV. BANGUN BANUA
KASIH SEPTIANA, ST	JAINAL HAKIM	RAGIL
		Pengawas Lapangan
	M. MAHLISANI	NENG INDAH
	Pengawas Lapangan	Pelaksana Lapangan

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN
KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

MINGGU KE : 7
TANGGAL : 14 Agustus - 21 Agustus 2025

KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025
SUB KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN	:	PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
DEPARTEMEN / INSTANSI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG
KONTRAKTOR	:	CV. BANGUN BANUA
NOMOR KONTRAK	:	B -1690/DPUPR/600.1.9/VI/2025, Tanggal 24 JUNI 2025
NILAI KONTRAK	:	Rp. 2.758.205.000,00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	DATA KONTRAK			KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN					
					Kuantitas			Bobot (%)		
		Satuan	Kuantitas	Bobot (%)	Minggu lalu	Minggu ini	Total	Terhadap Mgg lalu	Terhadap Mgg ini	Terhadap Total Pek.
	1. UMUM									
1,2	Mobilisasi, Item mobilisasi terdiri dari									
	a. Mobilisasi Asphalt Finisher	Unit	1,00	0,13	1,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,13
	b. Mobilisasi Tandem Roller	Unit	1,00	0,09	1,00	0,00	1,00	0,09	0,00	0,09
	c. Mobilisasi Tire Roller	Unit	1,00	0,13	1,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,13
	d. Mobilisasi Asphalt Distributor	Unit	1,00	0,01	1,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01
	e. Demobilisasi	Ls	1,00	0,11	0,00	1,00	1,00	0,00	0,11	0,11
1,8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas									
	a. Rambu Peringatan Pekerjaan Dengaan Kata - kata	Buah	2,00	0,01	2,00	0,00	2,00	0,01	0,00	0,01
	b. Rambu Peringatan Pekerjaan Di Jalan	Buah	2,00	0,01	2,00	0,00	2,00	0,01	0,00	0,01
	c. Pekerja (Flagman)	OB	2,00	0,29	2,00	0,00	2,00	0,29	0,00	0,29
1,19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri dari									
	a. Topi pelindung (Safety helmet)	Buah	8,00	0,02	8,00	0,00	8,00	0,02	0,00	0,02
	b. Sepatu keselamatan (Safety shoes)	Pasang	8,00	0,04	8,00	0,00	8,00	0,04	0,00	0,04
	c. Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah	8,00	0,02	8,00	0,00	8,00	0,02	0,00	0,02
	d. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu,Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban dll)	OB	1,00	0,01	1,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01
	e. Petugas K3	Ls	2,00	0,29	2,00	0,00	2,00	0,29	0,00	0,29
				1,16				1,05	0,11	1,16
	5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	52,50	1,11	52,50	0,00	52,50	1,11	0,00	1,11
				1,11				1,11	0,00	1,11
	6. PERKERASAN ASPAL									
6.1 (2a)	Lapisan Perekat - Aspal Cair	Liter	3.564,40	3,08	2646,18	918,22	3564,40	2,29	0,79	3,08
6.3.4a	Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	Ton	1.120,24	93,68	827,20	293,04	1120,24	69,18	24,51	93,68
6.3.8	Bahan anti Pengelupasan	Ton	201,64	0,96	148,90	52,74	201,64	0,71	0,25	0,96
				97,73				72,17	25,55	97,73
				100,00						100,00

Diperiksa oleh :
Dinas PUPR Bidang Bina Marga
PENGAWAS LAPANGAN

KASIH SEPTIANA, ST

JAINAH HAKIM

Diperiksa oleh :
Konsultan Pengawas
CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

[illegible]
Pengawas Lapangan

[illegible]
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BANGUN BANUA

NENG INDAH
Pelaksana Lapangan

Dipindai dengan CamScanner

CV. BANGUN BANUA

JL. ANGSANA RT.18 KELURAHAN MABUUN

KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

Laporan Mingguan

Tenaga dan Hari Kerja

MINGGU KE : SATU

TANGGAL : 30 JUNI - 06 JULI 2025

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU

KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA

PELAKSANA KONTRAKTOR / SM

NAMA : NENG INDAH

PENGAWAS LAPANGAN DPUPR

NAMA : KASIH SEPTIANA, ST

: JAINAL HAKIM

1. CUACA : JAM KERJA 08.00 s/d 17.00 Wita	Hari	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	
	Tanggal	30/06/2025	01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	05/07/2025	06/07/2025	
	Baik								
	Hujan								

2. JUMLAH TENAGA KERJA

1	SITE MANAGER								
2	PELAKSANA								
3	LOGISTIK								
4	MANDOR								
5	KEPALA KERJA								
6	TUKANG BATU								
7	TUKANG BESI								
8	TUKANG KAYU								
9	TUKANG PANCANG								
10	TUKANG LAS								
11	TUKANG GALI								
12	TUKANG BAJA								
13	MEKANIK								
14	OPERATOR								
15	PEKERJA/PEMBANTU								
16	PENJAGA								
17	SOPIR								
	JUMLAH TENAGA / KERJA / TOTAL								

3. MASALAH YANG TIMBUL

4. PEKERJAAN YANG TELAH DIPERIKSA

BELUM ADA KEGIATAN

HASIL

☐ BAIK ☐ CUKUP ☐ KURANG

5. T A M U

HARI	NAMA	INSTANSI

6. KEPUTUSAN YANG TELAH DIBERIKAN

7. CATATAN LAIN

Menyetujui,
Konsultan Pengawas
CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

RAGIL
Pengawas Lapangan

M. MAHLISANI
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BANGUN BANUA

NENG INDAH
Pelaksana Lapangan

Dipindai dengan CamScanner

CV. BANGUN BANUA

JL. ANGSANA RT.18 KELURAHAN MABUUN
KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

Laporan Mingguan

Tenaga dan Hari Kerja

MINGGU KE : DUA
TANGGAL : 07 JULI - 14 JULI 2025

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU

KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
PELAKSANA KONTRAKTOR / SM
NAMA : NENG INDAH

PENGAWAS LAPANGAN DPUPR
NAMA : KASIH SEPTIANA, ST
: JAINAL HAKIM

1. CUACA :
JAM KERJA
08.00 s/d 17.00 Wita

Hari	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN
Tanggal	07/07/2025	08/07/2025	09/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	12/07/2025	13/07/2025	14/07/2025
Baik								
Hujan								

2. JUMLAH TENAGA KERJA

1	SITE MANAGER								
2	PELAKSANA								
3	LOGISTIK								
4	MANDOR								
5	KEPALA KERJA								
6	TUKANG BATU								
7	TUKANG BESI								
8	TUKANG KAYU								
9	TUKANG PANCANG								
10	TUKANG LAS								
11	TUKANG GALI								
12	TUKANG BAJA								
13	MEKANIK								
14	OPERATOR								
15	PEKERJA/PEMBANTU								
16	PENJAGA								
17	SOPIR								
	JUMLAH TENAGA / KERJA / TOTAL								

3. MASALAH YANG TIMBUL

4. PEKERJAAN YANG TELAH DIPERIKSA

BELUM ADA KEGIATAN

HASIL
☐ BAIK ☐ CUKUP ☐ KURANG

5. T A M U

HARI	NAMA	INSTANSI

6. KEPUTUSAN YANG TELAH DIBERIKAN

7. CATATAN LAIN

Menyetujui,
Konsultan Pengawas
CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

RAGIL
Pengawas Lapangan

M. MAHLISANI
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BANGUN BANUA

NENG INDAH
Pelaksana Lapangan

Dipindai dengan CamScanner

CV. BANGUN BANUA

JL. ANGSANA RT.18 KELURAHAN MABUUN
KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

Laporan Mingguan

Tenaga dan Hari Kerja

MINGGU KE : TIGA
TANGGAL : 15 JULI - 21 JULI 2025

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU

KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
PELAKSANA KONTRAKTOR / SM
NAMA : NENG INDAH

PENGAWAS LAPANGAN DPUPR
NAMA : KASIH SEPTIANA, ST
: JAINAL HAKIM

1. CUACA :
JAM KERJA
08.00 s/d 17.00 Wita

Hari	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	
Tanggal	15/07/2025	16/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	19/07/2025	20/07/2025	21/07/2025	
Baik								
Hujan								

2. JUMLAH TENAGA KERJA

1	SITE MANAGER								
2	PELAKSANA								
3	LOGISTIK								
4	MANDOR								
5	KEPALA KERJA								
6	TUKANG BATU								
7	TUKANG BESI								
8	TUKANG KAYU								
9	TUKANG PANCANG								
10	TUKANG LAS								
11	TUKANG GALI								
12	TUKANG BAJA								
13	MEKANIK								
14	OPERATOR								
15	PEKERJA/PEMBANTU								
16	PENJAGA								
17	SOPIR								
	JUMLAH TENAGA / KERJA / TOTAL								

3. MASALAH YANG TIMBUL

4. PEKERJAAN YANG TELAH DIPERIKSA

BELUM ADA KEGIATAN

HASIL
☐ BAIK ☐ CUKUP ☐ KURANG

5. T A M U

HARI	NAMA	INSTANSI

6. KEPUTUSAN YANG TELAH DIBERIKAN

7. CATATAN LAIN

Menyetujui,
Konsultan Pengawas
CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

RAGIL
Pengawas Lapangan

M. MAHLISANI
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BANGUN BANUA

NENG INDAH
Pelaksana Lapangan

Dipindai dengan CamScanner

CV. BANGUN BANUA

JL. ANGSANA RT.18 KELURAHAN MABUUN
KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

Laporan Mingguan

Tenaga dan Hari Kerja

MINGGU KE : EMPAT
TANGGAL : 22 JULI - 29 JULI 2025

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU

KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
PELAKSANA KONTRAKTOR / SM
NAMA : NENG INDAH

PENGAWAS LAPANGAN DPUPR
NAMA : KASIH SEPTIANA, ST
: JAINAL HAKIM

1. CUACA :
JAM KERJA
08.00 s/d 17.00 Wita

Hari	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA
Tanggal	22/07/2025	23/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	26/07/2025	27/07/2025	28/07/2025	29/07/2025
Baik								
Hujan								

2. JUMLAH TENAGA KERJA

1	SITE MANAGER								
2	PELAKSANA	1	1	1	1				
3	LOGISTIK								
4	MANDOR								
5	KEPALA KERJA	1	1	1	1				
6	TUKANG BATU								
7	TUKANG BESI								
8	TUKANG KAYU								
9	TUKANG PANCANG								
10	TUKANG LAS								
11	TUKANG GALI								
12	TUKANG BAJA								
13	MEKANIK								
14	OPERATOR	1	1	1	1				
15	PEKERJA/PEMBANTU	8	8	8	8				
16	PENJAGA								
17	SOPIR	2	2	2	2				
	JUMLAH TENAGA / KERJA / TOTAL								

3. MASALAH YANG TIMBUL

4. PEKERJAAN YANG TELAH DIPERIKSA

LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A

HASIL
☐ BAIK ☐ CUKUP ☐ KURANG

5. T A M U

HARI	NAMA	INSTANSI

6. KEPUTUSAN YANG TELAH DIBERIKAN

7. CATATAN LAIN

Menyetujui,
Konsultan Pengawas
CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

RAGIL
Pengawas Lapangan

M. MAHLISANI
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BANGUN BANUA

NENG INDAH
Pelaksana Lapangan

Dipindai dengan CamScanner

CV. BANGUN BANUA

JL. ANGSANA RT.18 KELURAHAN MABUUN
KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

Laporan Mingguan

Tenaga dan Hari Kerja

MINGGU KE : LIMA
TANGGAL : 30 JULI - 05 AGUSTUS 2025

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU

KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
PELAKSANA KONTRAKTOR / SM
NAMA : NENG INDAH

PENGAWAS LAPANGAN DPUPR
NAMA : KASIH SEPTIANA, ST
: JAINAL HAKIM

1. CUACA : JAM KERJA 08.00 s/d 17.00 Wita	Hari	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA
	Tanggal	30/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	02/08/2025	03/08/2025	04/08/2025	05/08/2025
	Baik							
	Hujan							

2. JUMLAH TENAGA KERJA

1	SITE MANAGER							
2	PELAKSANA		1	1			1	1
3	LOGISTIK							
4	MANDOR		1	1			1	1
5	KEPALA KERJA		1	1			1	1
6	TUKANG BATU							
7	TUKANG BESI							
8	TUKANG KAYU							
9	TUKANG PANCANG							
10	TUKANG LAS							
11	TUKANG GALI							
12	TUKANG BAJA							
13	MEKANIK							
14	OPERATOR		3	3			3	3
15	PEKERJA/PEMBANTU		8	8			8	8
16	PENJAGA		2	2			2	2
17	SOPIR		14	14			14	14
	JUMLAH TENAGA / KERJA / TOTAL							

3. MASALAH YANG TIMBUL

4. PEKERJAAN YANG TELAH DIPERIKSA

ASPAL HRS-BASE

HASIL
☐ BAIK ☐ CUKUP ☐ KURANG

5. T A M U

HARI	NAMA	INSTANSI

6. KEPUTUSAN YANG TELAH DIBERIKAN

7. CATATAN LAIN

Menyetujui,
Konsultan Pengawas
CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

RAGIL
Pengawas Lapangan

M. MAHLISANI
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BANGUN BANUA

NENG INDAH
Pelaksana Lapangan

Dipindai dengan CamScanner

CV. BANGUN BANUA

JL. ANGSANA RT.18 KELURAHAN MABUUN
KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

Laporan Mingguan

Tenaga dan Hari Kerja

MINGGU KE : ENAM
TANGGAL : 06 AGUSTUS - 13 AGUSTUS 2025

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU

KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
PELAKSANA KONTRAKTOR / SM
NAMA : NENG INDAH

PENGAWAS LAPANGAN DPUPR
NAMA : KASIH SEPTIANA, ST
: JAINAL HAKIM

1. CUACA : JAM KERJA 08.00 s/d 17.00 Wita	Hari	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU
	Tanggal	06/08/2025	07/08/2025	08/08/2025	09/08/2025	10/08/2025	11/08/2025	12/08/2025	13/08/2025
	Baik								
	Hujan								

2. JUMLAH TENAGA KERJA

1	SITE MANAGER								
2	PELAKSANA	1	1	1					1
3	LOGISTIK								
4	MANDOR	1	1	1					1
5	KEPALA KERJA	1	1	1					1
6	TUKANG BATU								
7	TUKANG BESI								
8	TUKANG KAYU								
9	TUKANG PANCANG								
10	TUKANG LAS								
11	TUKANG GALI								
12	TUKANG BAJA								
13	MEKANIK								
14	OPERATOR	3	3	3					3
15	PEKERJA/PEMBANTU	8	8	8					8
16	PENJAGA	2	2	2					2
17	SOPIR	16	16	16					16
	JUMLAH TENAGA / KERJA / TOTAL								

3. MASALAH YANG TIMBUL

4. PEKERJAAN YANG TELAH DIPERIKSA

ASPAL HRS-BASE

HASIL
☐ BAIK ☐ CUKUP ☐ KURANG

5. T A M U

HARI	NAMA	INSTANSI

6. KEPUTUSAN YANG TELAH DIBERIKAN

7. CATATAN LAIN

Menyetujui,
Konsultan Pengawas
CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

RAGIL
Pengawas Lapangan

M. MAHLISANI
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BANGUN BANUA

NENG INDAH
Pelaksana Lapangan

Dipindai dengan CamScanner

CV. BANGUN BANUA

JL. ANGSANA RT.18 KELURAHAN MABUUN
KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

Laporan Mingguan

Tenaga dan Hari Kerja

MINGGU KE : TUJUH
TANGGAL : 14 AGUSTUS - 21 AGUSTUS 2025

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU

KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
PELAKSANA KONTRAKTOR / SM
NAMA : NENG INDAH

PENGAWAS LAPANGAN DPUPR
NAMA : KASIH SEPTIANA, ST
: JAINAL HAKIM

1. CUACA : JAM KERJA 08.00 s/d 17.00 Wita	Hari	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS
	Tanggal	14/08/2025	15/08/2025	16/08/2025	17/08/2025	18/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	21/08/2025
	Baik								
	Hujan								

2. JUMLAH TENAGA KERJA

1	SITE MANAGER								
2	PELAKSANA	1	1						
3	LOGISTIK								
4	MANDOR	1	1						
5	KEPALA KERJA	1	1						
6	TUKANG BATU								
7	TUKANG BESI								
8	TUKANG KAYU								
9	TUKANG PANCANG								
10	TUKANG LAS								
11	TUKANG GALI								
12	TUKANG BAJA								
13	MEKANIK								
14	OPERATOR	3	3						
15	PEKERJA/PEMBANTU	8	8						
16	PENJAGA	2	2						
17	SOPIR	21	21						
	JUMLAH TENAGA / KERJA / TOTAL								

3. MASALAH YANG TIMBUL

4. PEKERJAAN YANG TELAH DIPERIKSA

ASPAL HRS-BASE

HASIL
☐ BAIK ☐ CUKUP ☐ KURANG

5. T A M U

HARI	NAMA	INSTANSI

6. KEPUTUSAN YANG TELAH DIBERIKAN

7. CATATAN LAIN

Menyetujui,
Konsultan Pengawas
CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

KAGIL
Pengawas Lapangan

M. MAHLISANI
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BANGUN BANUA

NENG INDAH
Pelaksana Lapangan

Dipindai dengan CamScanner

Hal

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN

TANGGAL : 22-Jul-2025
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
KONSULTAN : CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

A. PEKERJAAN

No.	KODE	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
		LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A	13,13	SP.4 MURUNG
				PUDAK
				MASUKAU

B. TIBA / MUTASI : BAHAN PERALATAN

NO	JENIS	CACAH / VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN
1	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A	15,75	AMPIK	SP.4 MURUNG
				PUDAK
				MASUKAU

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS	CACAH/ VOLUME	LOKASI	NO	JENIS	IDLE	RUSAK
1.	Asphalt Finisher						
2.	Asphalt Sprayer						
3.	Compressor						
4.	Dump Truck	2					
5.	Excavator						
6.	Motor Greder						
7.	Three Wheel Roller						
8.	Tandem Roller	1					
9.	Vibrator Roller						
10.	Water Tanker						
11.	Alat Bantu	Ls					
12.							
13.							
14.							

D. PERSONIL PROYEK, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Kepala Kerja	1	SP.4 MURUNG PUDAK
			MASUKAU
2.	Pekerja	8	
3.	Sopir	2	
4.	Pengawas Lapangan	2	
5.	Pengawas Kontraktor	1	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR YA / TIDAK	
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		NAMA JELAS DAN TANDA TANGAN	
KONTRAKTOR		NENG INDAH	
KONSULTAN		RAGIL	
KONSULTAN		M. MAHLISANI	

Dipindai dengan CamScanner

Hal.

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN

TANGGAL : 23-Jul-2025
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
KONSULTAN : CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

A. PEKERJAAN

No.	KODE	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
		LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A	13,13	SP.4 MURUNG PUDAK MASUKAU

B. TIBA / MUTASI : BAHAN PERALATAN

NO	JENIS	CACAH / VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN
1	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A	15,75	AMPIK	SP.4 MURUNG PUDAK MASUKAU

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS	CACAH/ VOLUME	LOKASI	NO	JENIS	IDLE	RUSAK
1.	Asphalt Finisher						
2.	Asphalt Sprayer						
3.	Compressor						
4.	Dump Truck	2					
5.	Excavator						
6.	Motor Greder						
7.	Three Wheel Roller						
8.	Tandem Roller	1					
9.	Vibrator Roller						
10.	Water Tanker						
11.	Alat Bantu	Ls					
12.							
13.							
14.							

D. PERSONIL PROYEK, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Kepala Kerja	1	SP.4 MURUNG PUDAK MASUKAU
2.	Pekerja	8	
3.	Sopir	2	
4.	Pengawas Lapangan	2	
5.	Pengawas Kontraktor	1	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR YA / TIDAK	
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		NAMA JELAS DAN TANDA TANGAN	
KONTRAKTOR		NENG INDAH	
KONSULTAN		RAGIL	
KONSULTAN		M. MAHLISANI	

Dipindai dengan CamScanner

Hal.

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN

TANGGAL : 24-Jul-2025
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
KONSULTAN : CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

A. PEKERJAAN

No.	KODE	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
		LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A	13,13	SP.4 MURUNG PUDAK MASUKAU

B. TIBA / MUTASI : BAHAN PERALATAN

NO	JENIS	CACAH / VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN
1	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A	15,75	AMPIK	SP.4 MURUNG PUDAK MASUKAU

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS	CACAH/ VOLUME	LOKASI	NO	JENIS	IDLE	RUSAK
1.	Asphalt Finisher						
2.	Asphalt Sprayer						
3.	Compressor						
4.	Dump Truck	2					
5.	Excavator						
6.	Motor Greder						
7.	Three Wheel Roller						
8.	Tandem Roller	1					
9.	Vibrator Roller						
10.	Water Tanker						
11.	Alat Bantu	Ls					
12.							
13.							
14.							

D. PERSONIL PROYEK, KONTRAKTOR

NO	TUGAS JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Kepala Kerja	1	SP.4 MURUNG PUDAK MASUKAU
2.	Pekerja	8	
3.	Sopir	2	
4.	Pengawas Lapangan	2	
5.	Pengawas Kontraktor	1	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR YA / TIDAK	
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		NAMA JELAS DAN TANDA TANGAN	
KONTRAKTOR		NENG INDAH	
KONSULTAN		RAGIL	
KONSULTAN		M. MAHLISANI	

Dipindai dengan CamScanner

Hal.

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN

TANGGAL : 25-Jul-2025
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
KONSULTAN : CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

A. PEKERJAAN

No.	KODE	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
		LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A	13,13	SP.4 MURUNG PUDAK MASUKAU

B. TIBA / MUTASI : BAHAN PERALATAN

NO	JENIS	CACAH / VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN
1	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A	15,75	AMPIK	SP.4 MURUNG PUDAK MASUKAU

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS	CACAH/ VOLUME	LOKASI	NO	JENIS	IDLE	RUSAK
1.	Asphalt Finisher						
2.	Asphalt Sprayer						
3.	Compressor						
4.	Dump Truck	2					
5.	Excavator						
6.	Motor Greder						
7.	Three Wheel Roller						
8.	Tandem Roller	1					
9.	Vibrator Roller						
10.	Water Tanker						
11.	Alat Bantu	Ls					
12.							
13.							
14.							

D. PERSONIL PROYEK, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Kepala Kerja	1	SP.4 MURUNG PUDAK MASUKAU
2.	Pekerja	8	
3.	Sopir	2	
4.	Pengawas Lapangan	2	
5.	Pengawas Kontraktor	1	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR YA / TIDAK	
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		NAMA JELAS DAN TANDA TANGAN	
KONTRAKTOR		NENG INDAH	
KONSULTAN		RAGIL	
KONSULTAN		M. MAHLISANI	

Dipindai dengan CamScanner

Hal

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN

TANGGAL : 31-Jul-2025
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
KONSULTAN : CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

A. PEKERJAAN

No	KODE	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
		Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	311,55	SP.4 MURUNG
		Lataston Lapis Pondasi(HRS Base)	98,80	PUDAK
		Aditif anti pengelupasan	17,43	MASUKAU

B. TIBA / MUTASI : BAHAN PERALATAN

NO	JENIS	CACAH / VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN
1	Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	373,85	BALANGAN	SP.4 MURUNG
	Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	116,16		PUDAK
	Aditif anti pengelupasan	20,91		MASUKAU

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS	CACAH/ VOLUME	LOKASI	NO	JENIS	IDLE	RUSAK
1.	Asphalt Finisher	1					
2.	Asphalt Sprayer	1					
3.	Compressor						
4.	Dump Truck	14					
5.	Excavator						
6.	Motor Greder						
7.	Three Wheel Roller	1					
8.	Tandem Roller	1					
9.	Vibrator Roller						
10.	Water Tanker						
11.	Alat Bantu	Ls					
12.							
13.							
14.							

D. PERSONIL PROYEK KONTRAKTOR

NO.	TUGAS JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Kepala Kerja	1	SP.4 MURUNG PUDAK MASUKAU
2.	Pekerja	10	
3.	Sopir	14	
4.	Pengawas Lapangan	2	
5.	Pengawas Kontraktor	1	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR YA / TIDAK	
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		NAMA JELAS DAN TANDA TANGAN	
KONTRAKTOR		NENG INDAH	
KONSULTAN		RAGIL	
KONSULTAN		M. MAHLISANI	

Dipindai dengan CamScanner

Hal

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN

TANGGAL : 1-Agu-2025
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
KONSULTAN : CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

A. PEKERJAAN

No.	KODE	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
		Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	311,55	SP.4 MURUNG
		Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	96.80	PUDAK
		Aditif anti pengelupasan	17,43	MASUKAU

B. TIBA / MUTASI : BAHAN PERALATAN

NO	JENIS	CACAH / VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	373.85	BALANGAN	SP.4 MURUNG
	Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	116.16		PUDAK
	Aditif anti pengelupasan	20,91		MASUKAU

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS	CACAH/ VOLUME	LOKASI	NO	JENIS	IDLE	RUSAK
1.	Asphalt Finisher	1					
2.	Asphalt Sprayer	1					
3.	Compressor						
4.	Dump Truck	14					
5.	Excavator						
6.	Motor Greder						
7.	Three Wheel Roller	1					
8.	Tandem Roller	1					
9.	Vibrator Roller						
10.	Water Tanker						
11.	Alat Bantu	Ls					
12.							
13.							
14.							

D. PERSONIL PROYEK, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Kepala Kerja	1	SP.4 MURUNG PUDAK MASUKAU
2.	Pekerja	10	
3.	Sopir	14	
4.	Pengawas Lapangan	2	
5.	Pengawas Kontraktor	1	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR YA / TIDAK	
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		NAMA JELAS DAN TANDA TANGAN	
KONTRAKTOR		NENG INDAH	
KONSULTAN		RAGIL	
KONSULTAN		M. MAHLISANI	

Dipindai dengan CamScanner

Hal

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN

TANGGAL : 4-Agu-2025
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
KONSULTAN : CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

A. PEKERJAAN

No	KODE	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
		Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	311.55	SP.4 MURUNG
		Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	96.80	PUDAK
		Aditif anti pengelupasan	17.43	MASUKAU

B. TIBA / MUTASI : BAHAN PERALATAN

NO	JENIS	CACAH / VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	373.85	BALANGAN	SP.4 MURUNG
	Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	116.16		PUDAK
	Aditif anti pengelupasan	20.91		MASUKAU

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS	CACAH/ VOLUME	LOKASI	NO	JENIS	IDLE	RUSAK
1.	Asphalt Finisher	1					
2.	Asphalt Sprayer	1					
3.	Compressor						
4.	Dump Truck	14					
5.	Excavator						
6.	Motor Greder						
7.	Three Wheel Roller	1					
8.	Tandem Roller	1					
9.	Vibrator Roller						
10.	Water Tanker						
11.	Alat Bantu	Ls					
12.							
13.							
14.							

D. PERSONIL PROYEK, KONTRAKTOR

NO	TUGAS JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Kepala Kerja	1	SP.4 MURUNG PUDAK
			MASUKAU
2	Pekerja	10	
3	Sopir	14	
4	Pengawas Lapangan	2	
5	Pengawas Kontraktor	1	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR YA / TIDAK	
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		NAMA JELAS DAN TANDA TANGAN	
KONTRAKTOR		NENG INDAH	
KONSULTAN		RAGIL	
KONSULTAN		M. MAHLISANI	

Dipindai dengan CamScanner

Hal

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN

TANGGAL : 5-Agu-2025
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
KONSULTAN : CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

A. PEKERJAAN

No.	KODE	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
		Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	311.55	SP.4 MURUNG
		Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	96,80	PUDAK
		Aditif anti pengelupasan	17,43	MASUKAU

B. TIBA / MUTASI : BAHAN PERALATAN

NO	JENIS	CACAH / VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	373,85	BALANGAN	SP.4 MURUNG
	Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	116,16		PUDAK
	Aditif anti pengelupasan	20,91		MASUKAU

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS	CACAH/ VOLUME	LOKASI	NO	JENIS	IDLE	RUSAK
1.	Asphalt Finisher	1					
2.	Asphalt Sprayer	1					
3	Compressor						
4.	Dump Truck	14					
5.	Excavator						
6.	Motor Greder						
7.	Three Wheel Roller	1					
8.	Tandem Roller	1					
9.	Vibrator Roller						
10.	Water Tanker						
11.	Alat Bantu	Ls					
12.							
13.							
14.							

D. PERSONIL PROYEK, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Kepala Kerja	1	SP.4 MURUNG PUDAK MASUKAU
2.	Pekerja	10	
3.	Sopir	14	
4	Pengawas Lapangan	2	
5	Pengawas Kontraktor	1	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR YA / TIDAK	
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Corah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		NAMA JELAS DAN TANDA TANGAN
KONTRAKTOR		NENG INDAH
KONSULTAN		RAGIL
KONSULTAN		M. MAHLISANI

Dipindai dengan CamScanner

Hal

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN

TANGGAL : 6-Agu-2025
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
KONSULTAN : CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

A. PEKERJAAN

No.	KODE	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
		Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	350,00	SP.4 MURUNG
		Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	110,00	PUDAK
		Aditif anti pengelupasan	19,80	MASUKAU

B. TIBA / MUTASI : BAHAN PERALATAN

NO	JENIS	CACAH / VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	420,00	BALANGAN	SP.4 MURUNG
	Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	132,00		PUDAK
	Aditif anti pengelupasan	23,76		MASUKAU

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS	CACAH/ VOLUME	LOKASI	NO	JENIS	IDLE	RUSAK
1.	Asphalt Finisher	1					
2.	Asphalt Sprayer	1					
3.	Compressor						
4.	Dump Truck	16					
5.	Excavator						
6.	Motor Greder						
7.	Three Wheel Roller	1					
8.	Tandem Roller	1					
9.	Vibrator Roller						
10.	Water Tanker						
11.	Alat Bantu	Ls					
12.							
13.							
14.							

D. PERSONIL PROYEK, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Kepala Kerja	1	SP.4 MURUNG PUDAK
			MASUKAU
2.	Pekerja	10	
3.	Sopir	16	
4.	Pengawas Lapangan	2	
5.	Pengawas Kontraktor	1	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR YA / TIDAK	
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		NAMA JELAS DAN TANDA TANGAN	
KONTRAKTOR		NENG INDAH	
KONSULTAN		RAGIL	
KONSULTAN		M. MAHLISANI	

Dipindai dengan CamScanner

Hal

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN

TANGGAL : 7-Agu-2025
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
KONSULTAN : CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

A. PEKERJAAN

No.	KODE	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
		Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	350,00	SP.4 MURUNG
		Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	110,00	PUDAK
		Aditif anti pengelupasan	19,80	MASUKAU

B. TIBA / MUTASI : BAHAN PERALATAN

NO	JENIS	CACAH / VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	420,00	BALANGAN	SP.4 MURUNG
	Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	132,00		PUDAK
	Aditif anti pengelupasan	23,76		MASUKAU

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS	CACAH/ VOLUME	LOKASI	NO	JENIS	IDLE	RUSAK
1.	Asphalt Finisher	1					
2.	Asphalt Sprayer	1					
3.	Compressor						
4.	Dump Truck	16					
5.	Excavator						
6.	Motor Greder						
7.	Three Wheel Roller	1					
8.	Tandem Roller	1					
9.	Vibrator Roller						
10.	Water Tanker						
11.	Alat Bantu	Ls					
12.							
13.							
14.							

D. PERSONIL PROYEK, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Kepala Kerja	1	SP.4 MURUNG PUDAK MASUKAU
2.	Pekerja	10	
3.	Sopir	16	
4.	Pengawas Lapangan	2	
5.	Pengawas Kontraktor	1	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR YA / TIDAK	
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		NAMA JELAS DAN TANDA TANGAN	
KONTRAKTOR		NENG INDAH	
KONSULTAN		RAGIL	
KONSULTAN		M. MAHLISANI	

Dipindai dengan CamScanner

Hal

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN

TANGGAL : 8-Agu-2025
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
KONSULTAN : CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

A. PEKERJAAN

No.	KODE	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
		Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	350,00	SP.4 MURUNG
		Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	110,00	PUDAK
		Aditif anti pengelupasan	19,80	MASUKAU

B. TIBA / MUTASI : BAHAN PERALATAN

NO	JENIS	CACAH / VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	420,00	BALANGAN	SP.4 MURUNG
	Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	132,00		PUDAK
	Aditif anti pengelupasan	23,76		MASUKAU

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS	CACAH/ VOLUME	LOKASI	NO	JENIS	IDLE	RUSAK
1.	Asphalt Finisher	1					
2.	Asphalt Sprayer	1					
3.	Compressor						
4.	Dump Truck	16					
5.	Excavator						
6.	Motor Greder						
7.	Three Wheel Roller	1					
8.	Tandem Roller	1					
9.	Vibrator Roller						
10.	Water Tanker						
11.	Alat Bantu	Ls					
12.							
13.							
14.							

D. PERSONIL PROYEK, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Kepala Kerja	1	SP.4 MURUNG PUDAK MASUKAU
2.	Pekerja	10	
3.	Sopir	16	
4.	Pengawas Lapangan	2	
5.	Pengawas Kontraktor	1	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR YA / TIDAK	
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		NAMA JELAS DAN TANDA TANGAN
KONTRAKTOR		NENG INDAH
KONSULTAN		RAGIL
KONSULTAN		M. MAHLISANI

Dipindai dengan CamScanner

Hal

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN

TANGGAL : 13-Agu-2025
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
KONSULTAN : CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

A. PEKERJAAN

No.	KODE	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
		Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	350,00	SP.4 MURUNG
		Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	110,00	PUDAK
		Aditif anti pengelupasan	19,80	MASUKAU

B. TIBA / MUTASI : BAHAN PERALATAN

NO	JENIS	CACAH / VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	420,00	BALANGAN	SP.4 MURUNG
	Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	132,00		PUDAK
	Aditif anti pengelupasan	23,76		MASUKAU

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS	CACAH / VOLUME	LOKASI	NO	JENIS	IDLE	RUSAK
1.	Asphalt Finisher	1					
2.	Asphalt Sprayer	1					
3.	Compressor						
4.	Dump Truck	16					
5.	Excavator						
6.	Motor Greder						
7.	Three Wheel Roller	1					
8.	Tandem Roller	1					
9.	Vibrator Roller						
10.	Water Tanker						
11.	Alat Bantu	Ls					
12.							
13.							
14.							

D. PERSONIL PROYEK, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Kepala Kerja	1	SP.4 MURUNG PUDAK MASUKAU
2.	Pekerja	10	
3.	Sopir	16	
4.	Pengawas Lapangan	2	
5.	Pengawas Kontraktor	1	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR YA / TIDAK	
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		NAMA JELAS DAN TANDA TANGAN	
KONTRAKTOR		NENG INDAH	
KONSULTAN		RAGIL	
KONSULTAN		M. MAHLISANI	

Dipindai dengan CamScanner

Hal

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN

TANGGAL : 14-Agu-2025
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP 4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
KONSULTAN : CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

A. PEKERJAAN

No.	KODE	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
		Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	459.11	SP 4 MURUNG
		Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	148.52	PUDAK
		Aditif anti pengelupasan	26.37	MASUKAU

B. TIBA / MUTASI : BAHAN PERALATAN

NO	JENIS	CACAH / VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	550.93	BALANGAN	SP 4 MURUNG
	Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	178.82		PUDAK
	Aditif anti pengelupasan	31.65		MASUKAU

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS	CACAH / VOLUME	LOKASI	NO	JENIS	IDLE	RUSAK
1.	Asphalt Finisher	1					
2.	Asphalt Sprayer	1					
3.	Compressor						
4.	Dump Truck	21					
5.	Excavator						
6.	Motor Grader						
7.	Three Wheel Roller	1					
8.	Tandem Roller	1					
9.	Vibrator Roller						
10.	Water Tanker						
11.	Alat Bantu	Ls					
12.							
13.							
14.							

D. PERSONIL PROYEK, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Kepala Kerja	1	SP.4 MURUNG PUDAK MASUKAU
2.	Pekerja	10	
3.	Sopir	21	
4.	Pengawas Lapangan	2	
5.	Pengawas Kontraktor	1	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR YA / TIDAK	
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		NAMA JELAS DAN TANDA TANGAN	
KONTRAKTOR		NENG INDAH	
KONSULTAN		RAGIL	
KONSULTAN		M. MAHLISANI	

Dipindai dengan CamScanner

Hal

BUKU HARIAN STANDAR

CATATAN HARIAN

TANGGAL : 15-Agu-2025
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN SP.4 MURUNG PUDAK - MASUKAU
KONTRAKTOR : CV. BANGUN BANUA
KONSULTAN : CV. AZ ZAHRA ALTASMIM

A. PEKERJAAN

No.	KODE	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
		Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	459,11	SP.4 MURUNG
		Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	146,52	PUDAK
		Aditif anti pengelupasan	26,37	MASUKAU

B. TIBA / MUTASI : BAHAN PERALATAN

NO	JENIS	CACAH / VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	650,93	BALANGAN	SP.4 MURUNG
	Lataston Lapis Pondasi(HRS-Base)	175,82		PUDAK
	Aditif anti pengelupasan	31,65		MASUKAU

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO.	JENIS	CACAH/ VOLUME	LOKASI	NO	JENIS	IDLE	RUSAK
1.	Asphalt Finisher	1					
2.	Asphalt Sprayer	1					
3.	Compressor						
4.	Dump Truck	21					
5.	Excavator						
6.	Motor Greder						
7.	Three Wheel Roller	1					
8.	Tandem Roller	1					
9.	Vibrator Roller						
10.	Water Tanker						
11.	Alat Bantu	Ls					
12.							
13.							
14.							

D. PERSONIL PROYEK, KONTRAKTOR

NO.	TUGAS JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Kepala Kerja	1	SP.4 MURUNG PUDAK MASUKAU
2.	Pekerja	10	
3.	Sopir	21	
4.	Pengawas Lapangan	2	
5.	Pengawas Kontraktor	1	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	JENIS	JAM	LOKASI	TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR YA / TIDAK	
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3	Banjir / Genangan Air				
4	Longsor				
5	Cerah				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN		NAMA JELAS DAN TANDA TANGAN	
KONTRAKTOR		NENG INDAH	
KONSULTAN		RAGIL	
KONSULTAN		M. MAHLISANI	

Dipindai dengan CamScanner
